




AKTUELLER PROJEKTSTATUS

Kosten und Budget → Ergebnis Kostenberechnung

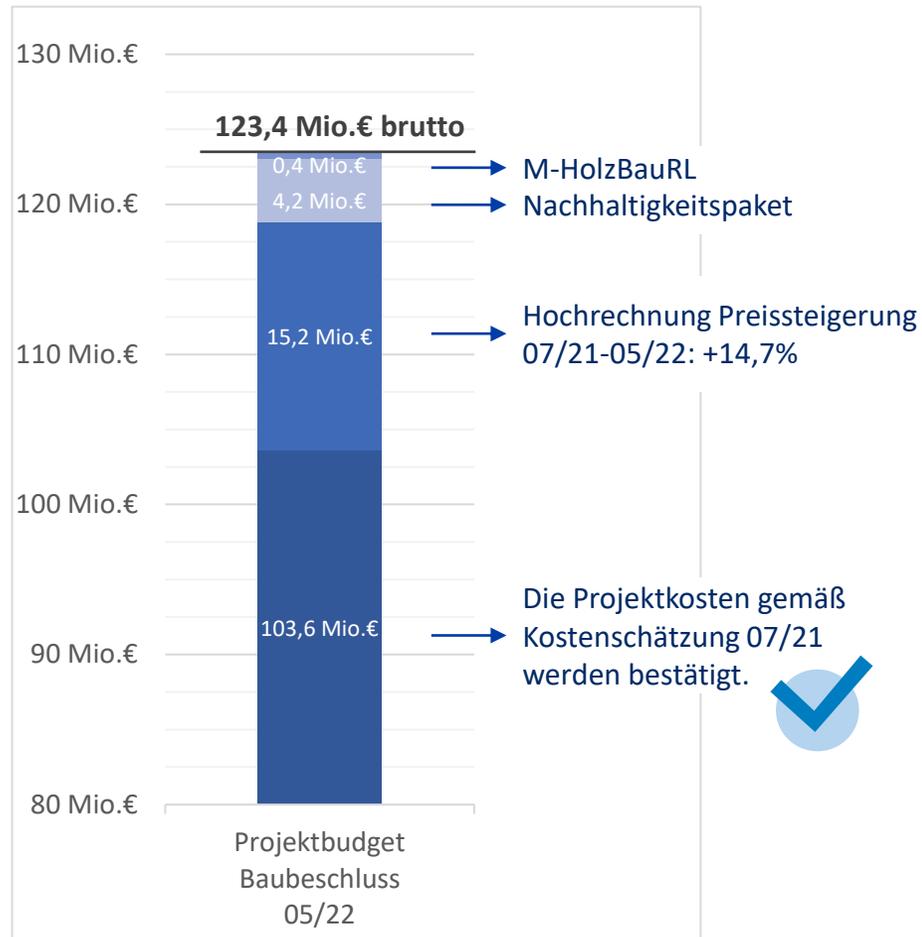

- Der Vorentwurf zum Projekt wurde im Kreistag im Juli 2021 vorgestellt. Auf Basis der beinhalteten Kostenschätzung wurde ein Projektbudget in Höhe von 103,6 Mio.€ brutto definiert.
- Mit Stand 02/2022 wurde die Kostenberechnung planungsdisziplin-übergreifend abgegeben. Im 02/2022 haben diverse Workshops zur Zielbudgeterreicherung stattgefunden, Einsparungen wurden gezogen.
- Zum Abschluss der Kostenberechnung im 05/2022 wird, abgeleitet aus 3.+4.QT 2021 eine Preissteigerung von 14,7 % angenommen. Preissteigerungen in die Zukunft können nur geschätzt werden.
- Ergänzende Anforderungen wurden integriert:
 - M-HolzBauRL (0,4 Mio.€)
- Dem Gremium werden nachfolgende Bausteine im Nachhaltigkeitspaket empfohlen. Hierfür wird das angegebene Mehrbudget erforderlich:
 - Beibehaltung KfW40-Standard (3,8 Mio.€)
 - Beibehaltung Photovoltaik an der Fassade Sporthalle (0,26 Mio.€)
 - Beibehaltung Zisterne für Regenwassernutzung (0,14 Mio.€)
