



LANDKREIS
KONSTANZ



PROJEKTBILDER – ERSATZNEUBAU GU KASERNENSTRASSE 60/2

Stand 13. November 2025



› | www.LRAKN.de





BAUFORTSCHRITT

❖ Dachabdichtung


Alle Lagen der Dachabdichtung wurde vollständig aufgebracht. Das Dach ist vollständig gedämmt.





BAUFORTSCHRITT


- ❖ **Zimmermannsarbeiten**
Der Dachüberstand und der Dachausstieg wurde montiert.
- ❖ **Blechnerarbeiten**
Die Kastenrinnen wurden montiert.
- ❖ **Schlosserarbeiten**
Die Absturzsicherungen entlang der Laubengänge wurden montiert.

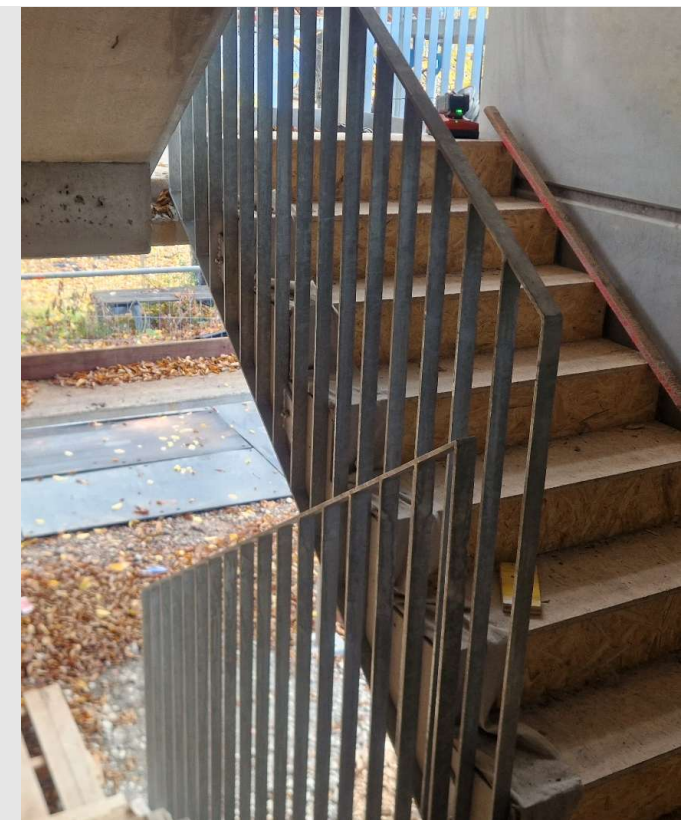



BAUFORTSCHRITT

- ❖ **HLS-Installation**
Die Rohinstallation der HLS-Gewerke geht gut voran.
- ❖ **Elektro-Installation**
Die Rohinstallation Elektro sind fast abgeschlossen.

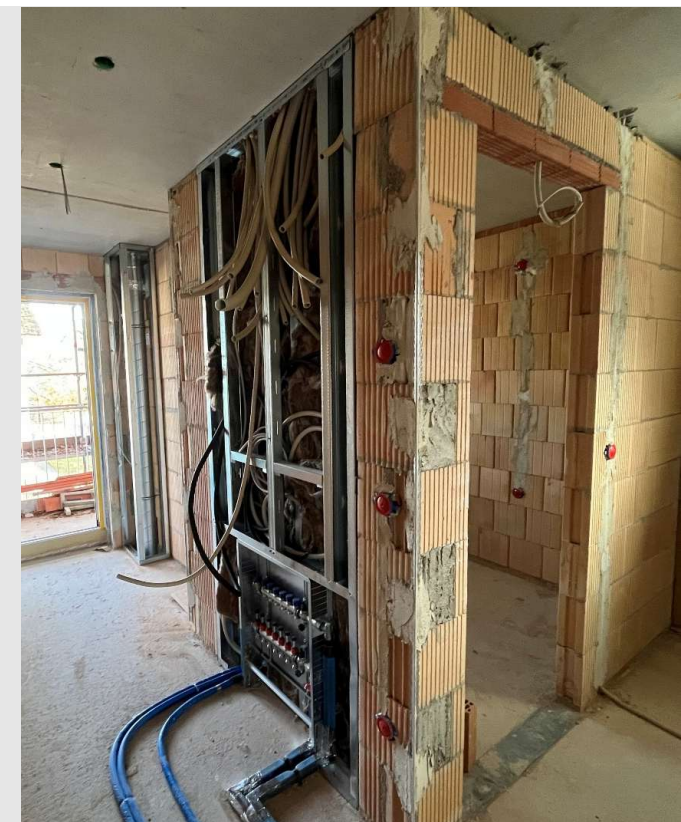



BAUFORTSCHRITT

❖ Innenputz

Die vorbereitenden Arbeiten (z.B. Eckschienen setzten) für den Innenputz werden aktuell ausgeführt.

❖ Innentürzargen

Die Innentürzargen wurden überwiegend eingebaut.





RICHTFEST

• Richtfest

Am 5. November 2025 wurde das Richtfest auf der Baustelle gefeiert.



Bildquelle: https://www.wochenblatt.net/radolfzell/c-nachrichten/dritter-bauabschnitt-der-unterkunft-nimmt-gestalt-an_a154494



AKTUELLER STAND

• Anstehende Vergaben Paket 5.2

Fliesenarbeiten	82.100 EUR <i>in Prüfung</i>
Bodenbelagsarbeiten	22.900 EUR <i>in Prüfung</i>

• Kommende Ausschreibungen Paket 6

PV-Anlage und Außenanlagen

• Budget 3,7 Mio. EUR

bereits beauftragt	2.405.000 EUR
anstehende Beauftragungen Paket 5.2	105.000 EUR
anstehende Ausschreibungen Paket 6	130.000 EUR
freie Mittel (für weitere Bauleistungen)	1.060.000 EUR



**LANDKREIS
KONSTANZ**



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de
