



LANDKREIS
KONSTANZ



PROJEKTBILDER – ERSATZNEUBAU GU KASERNENSTRASSE 60/2

Stand 21. April 2026



› | www.LRAKN.de



BAUFORTSCHRITT

• Fliesen

Der Einbau der Boden- Und Wandfliesen ist weit vorangeschritten.





BAUFORTSCHRITT

• Malerarbeiten


Die Malerarbeiten im Innenraum sind abgeschlossen.






BAUFORTSCHRITT

- **Elektroinstallation**
Die Endmontage der Elektroinstallationen hat begonnen.

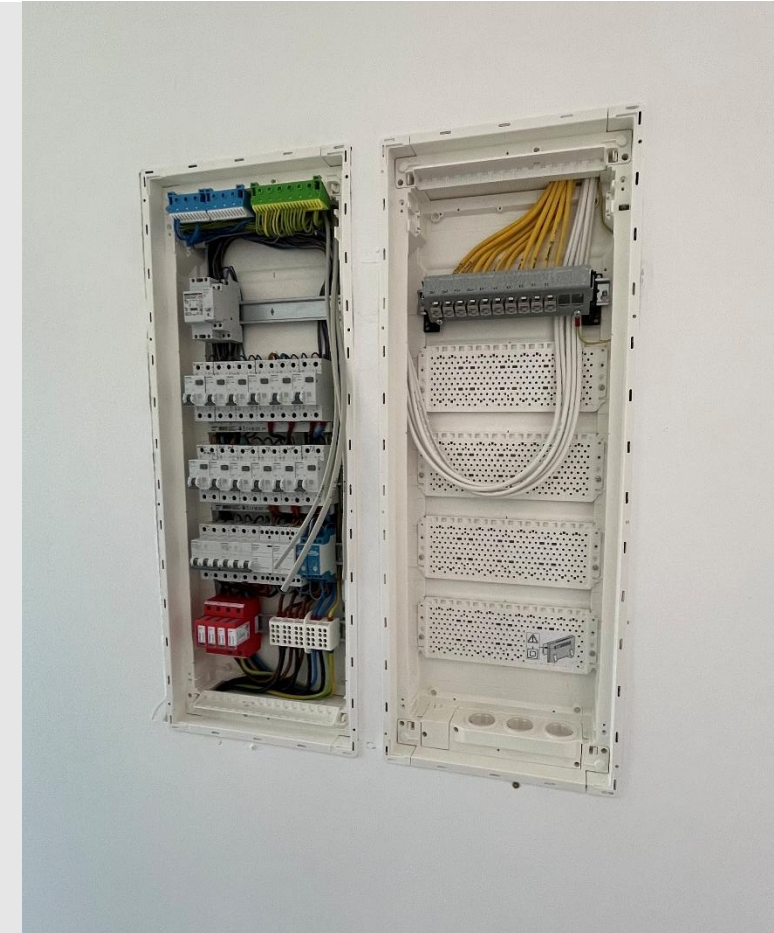




BAUFORTSCHRITT

• Laubengang

Die Abdichtungsarbeiten auf dem Laubengang sind abgeschlossen. Der Belag wird aktuell verlegt.





BAUFORTSCHRITT

• Außenanlage

Die Arbeiten an der Außenanlage wurden begonnen.





AKTUELLER STAND

• Einweihung am 1. Oktober 2026

Die Einweihung ist für den 1. Oktober 2026 geplant.
Die Einladungen folgen zu gegebener Zeit.

• Budget 3,7 Mio. EUR

bereits beauftragt 2.675.000 EUR *Abrechnungsstand ca. 75%*
inkl. Beauftragungen Kleinaufträge

freie Mittel (für weitere Bauleistungen) 1.025.000 EUR



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de
