




LANDKREIS
KONSTANZ



NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM KONSTANZ

Bilder: Stand 27. Januar 2025 bis 6. März 2025

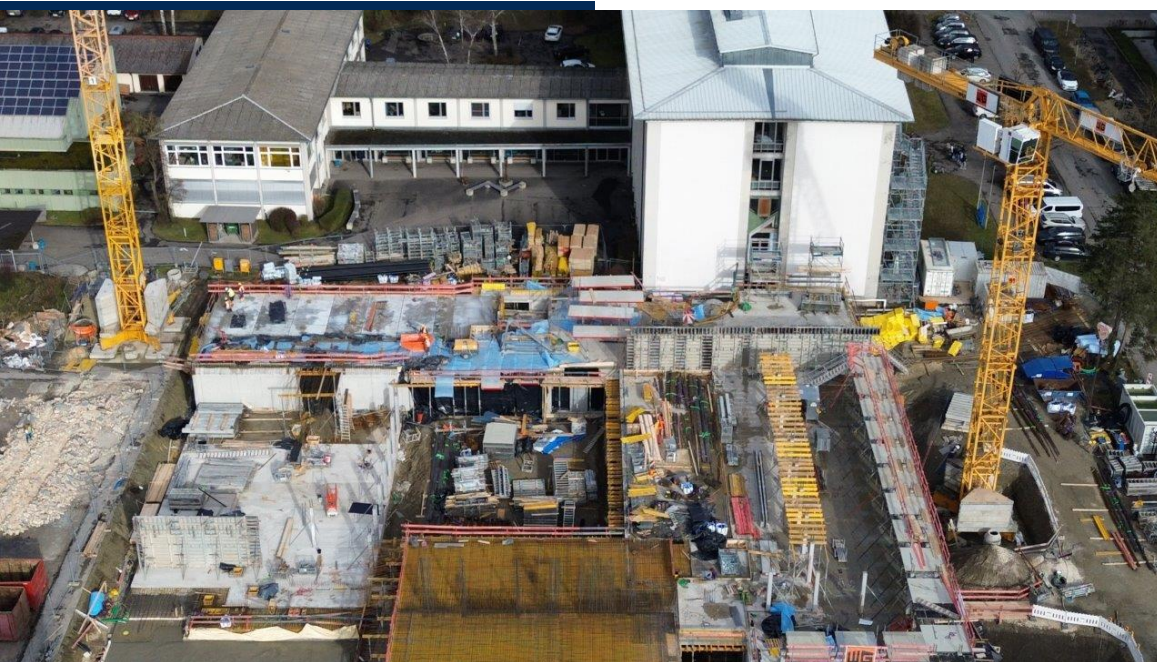

› | www.LRAKN.de



BAUFORTSCHRITT

❖ Bauphase Süd Überblick

Luftbild von Süden

Im Bild von Links:

GT 1

Freies Feld nach Rückbau G

Baustelle ZG







BAUFORTSCHRITT

❖ Werkstattgebäude 1 (GT 1)

Schweißkabinen Metallwerkstatt
Klassenzimmer Obergeschoss
mit mobiler Trennwand

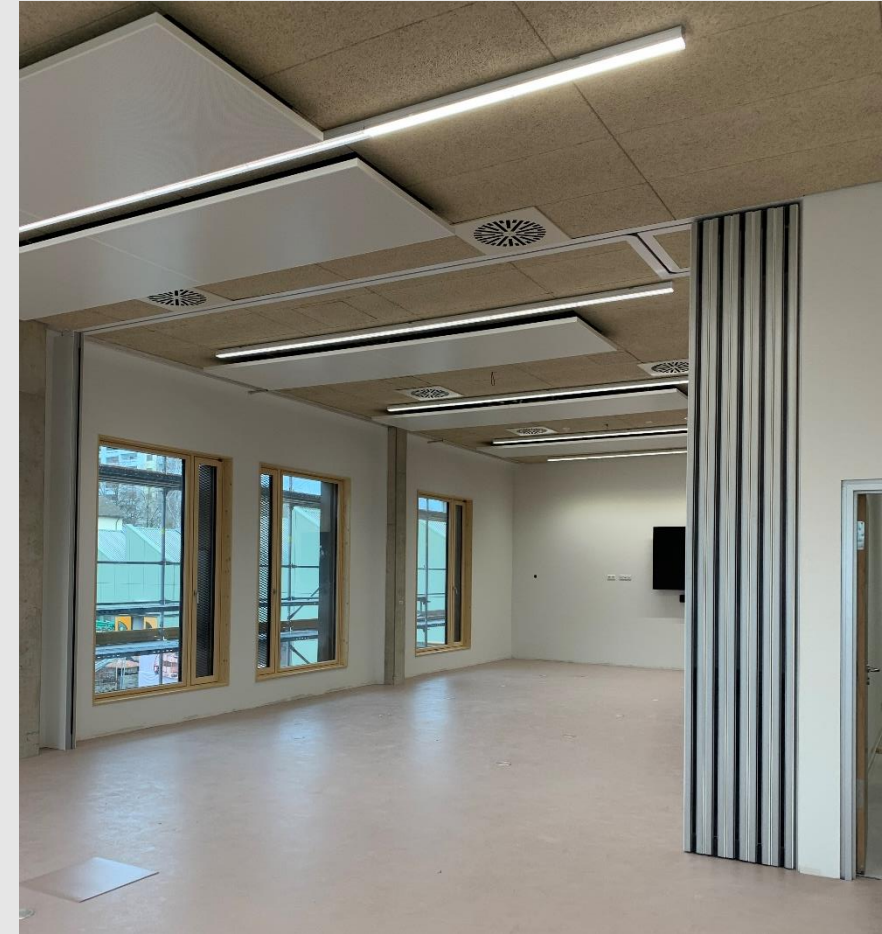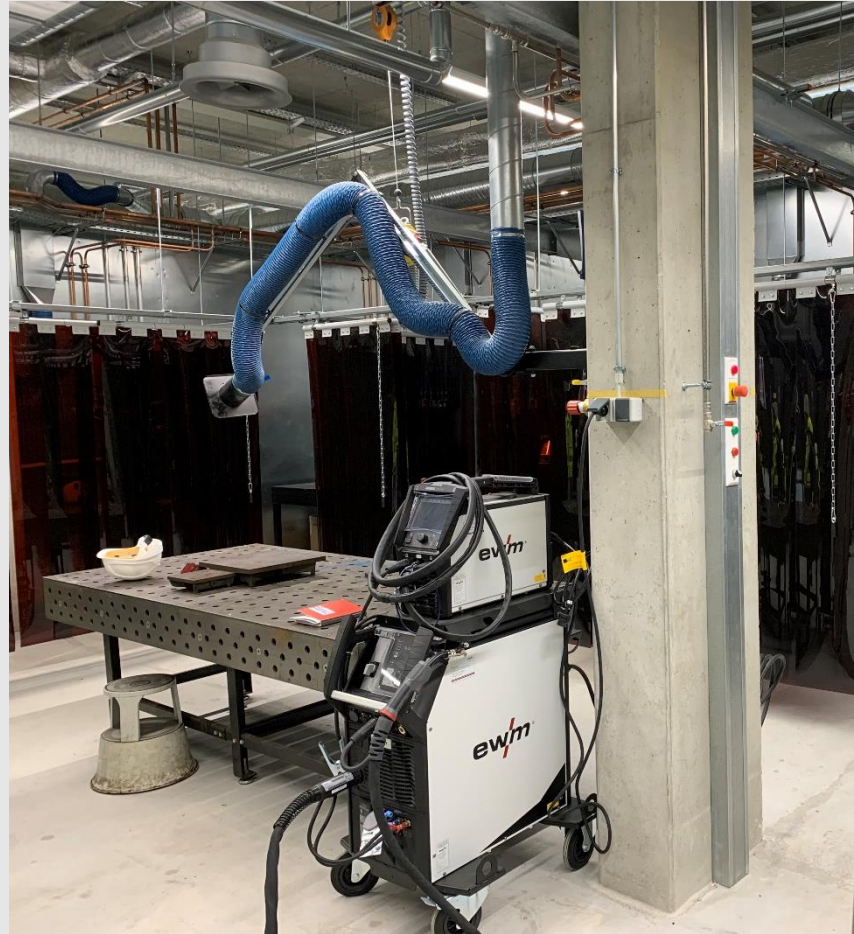





BAUFORTSCHRITT

❖ Zentralgebäude (ZG)

Luftbild von Süden
Holz-Beton-Verbunddecke

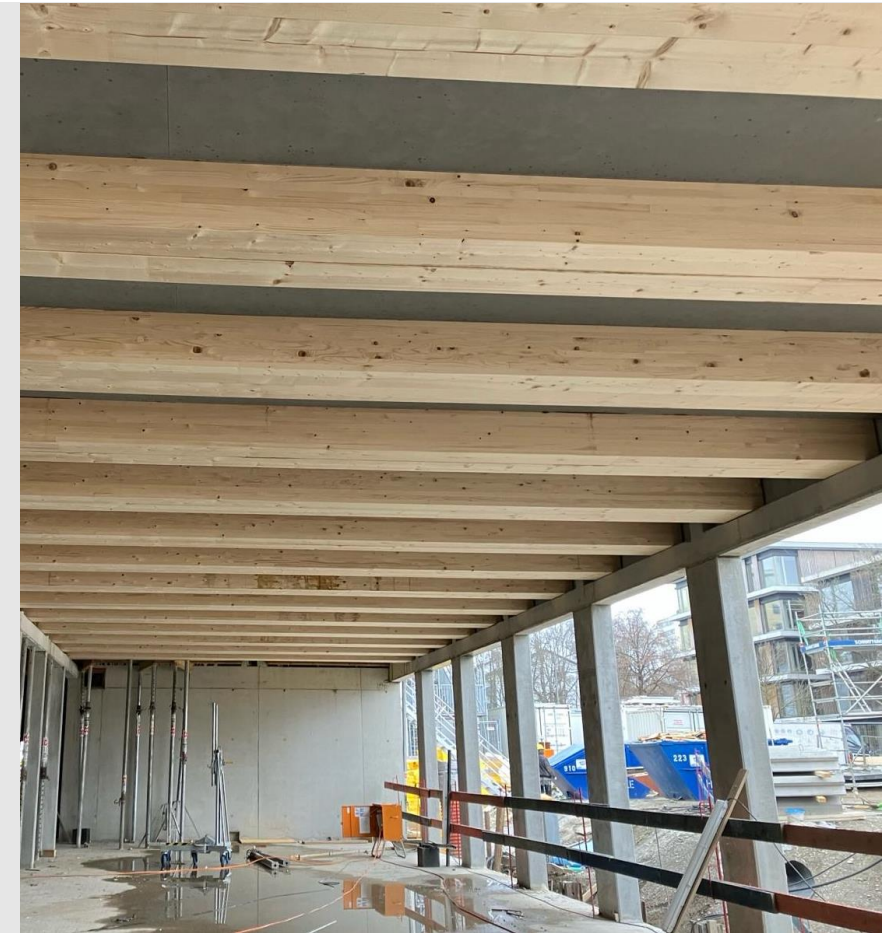



VERGABE

Paket 10 BA 02/2025	Aufträge (ohne Wartung)
Küchentechnik ZG	358.806 EUR
Kleinkälte ZG	150.348 EUR
Dachabdichtung ZG	847.538 EUR
KT 03/2025	
Holzfassade und Holz-Alufenster ZG und GT2	5.735.385 EUR
Summe Vergaben	7.092.077 EUR

Paket 11 BA 05/2025	LV bepreist
Trockenbau Wände GT2 und ZG inkl. Ersatzvornahmen	
Türen - Alu-/ Glasrohrrahmen ZG	
Stahltüren ZG	
Systemtrennwand – Glas ZG	
Hohlraum- und Doppelböden ZG	
Schlosser	
NaWi	
Summe LV bepreist	rd. 4.510.000 EUR



KOSTENÜBERSICHT MIT PROGNOSE BAUPHASE SÜD

❖ Budget Süd 99,65 Mio. EUR

Aufträge vergeben 76,07 Mio. EUR

Noch zu vergeben 14,93 Mio. EUR

Risiken 3,50 Mio. EUR

❖ Prognose Süd 94,50 Mio. EUR

❖ Freie Mittel 5,15 Mio. EUR



BAUFORTSCHRITT

❖ Bauphase Süd

Lageplan

- ❖ GT1 – fertig
- ❖ GT2- Beginn Rohbau
- ❖ ZG – Rohbau fertig bis Juni 2025





LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de
